


千里眼**DICT**集成服务细化管理方案

市场运营部|视频物联网产品部

2026年5月

一、服务包分类管理，产品部门与产创中心按需规划建设

- 公司内部对服务包细化管理，分成“产品定制类”和“集成装维类”两类，由各产品部门、产创中心共同参与服务包立项建设
- “产品定制类”服务包明确场景、明确应用，按行业产品功能形态、应用场景分类设计资费条目；“集成装维类”服务包继续使用通用性资费条目

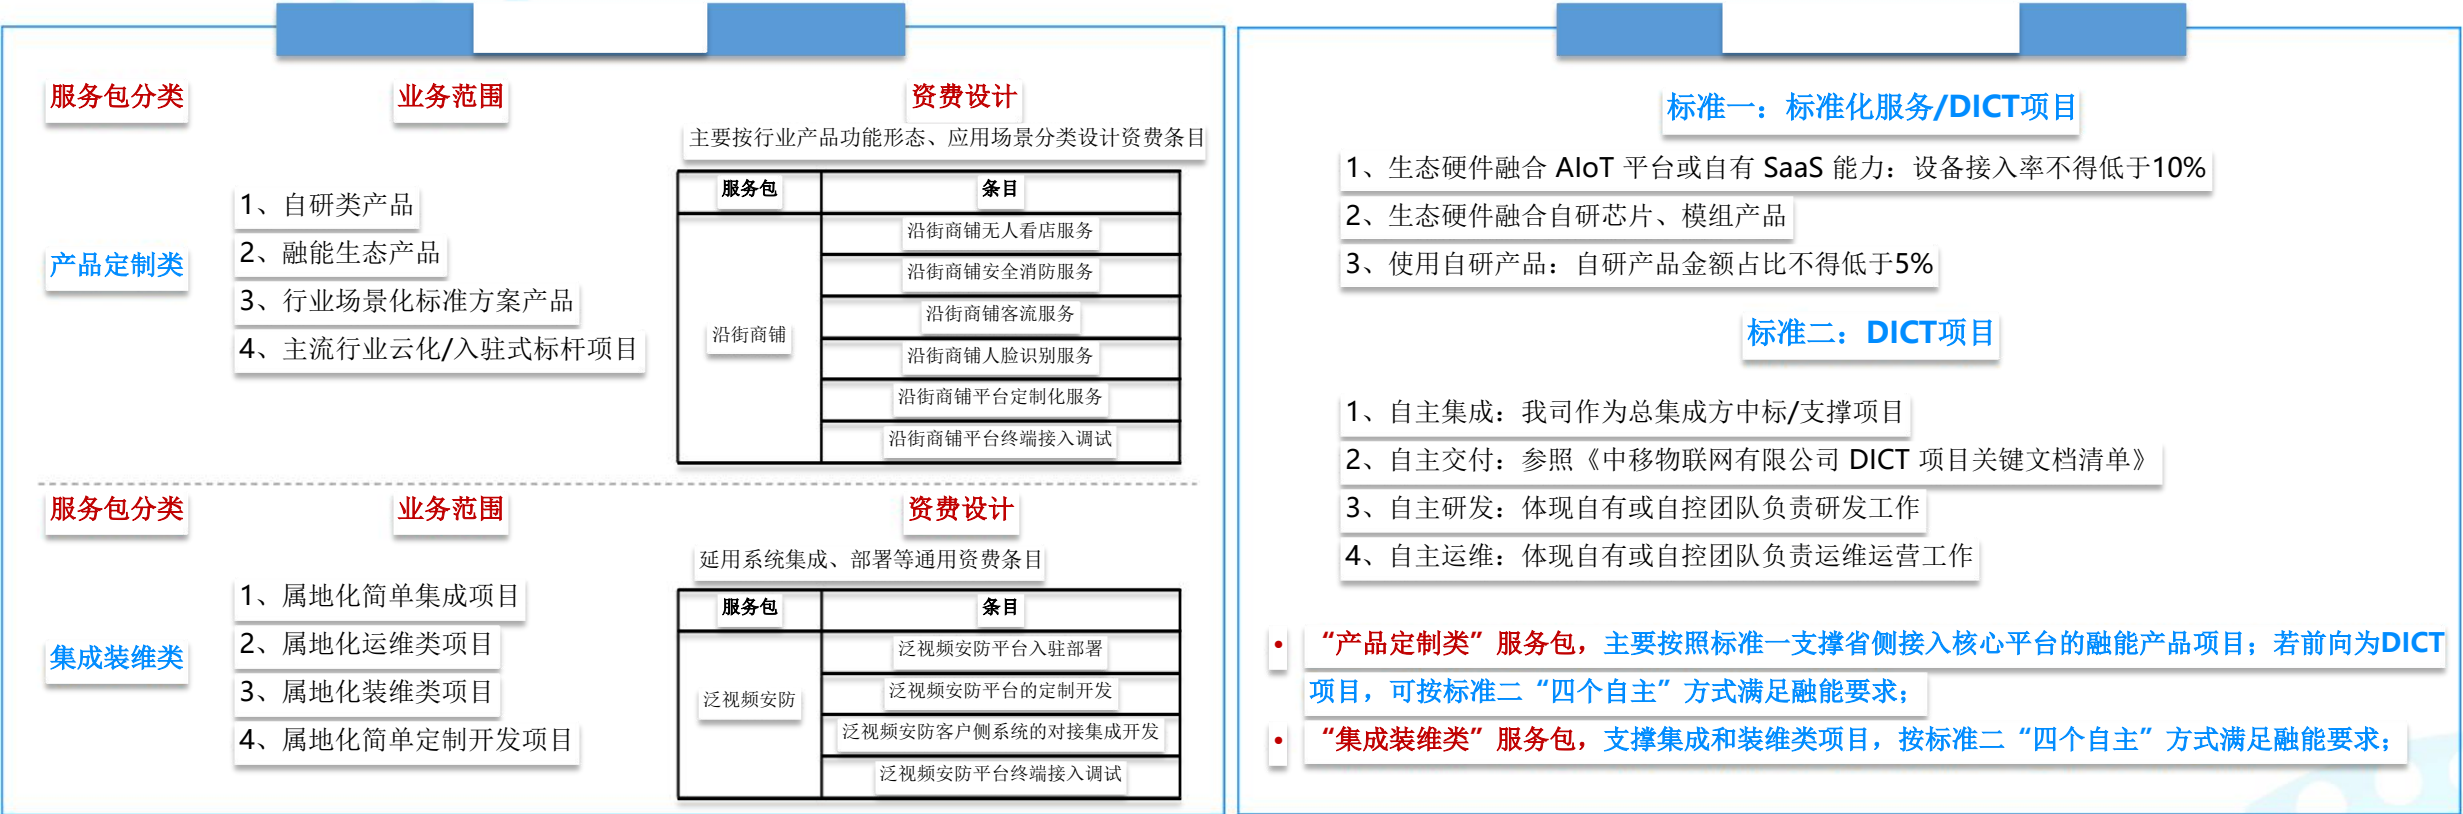


- 产品部门主要发展“产品定制类”服务包，打造符合融能规范的标准化产品，按需通过“集成装维类”服务包支撑装维、集成类项目
- 产创中心仅支持按需规划属地“集成装维类”服务包，支撑交付属地装维、属地简单集成交付的项目
- 原则上DICT服务包谁规划设计，谁负责；产品线主责部门对全量服务包负管理责任（如：千里眼产品线服务包，视频部均负管理责任）



二、千里眼属地“集成装维类”服务包规划上架责任分工



- 视频部负责统筹管理千里眼产品线**DICT**服务包，根据属地业务需求，由**产创中心**负责属地“集成装维类”服务包规划设计
- 上架阶段，产创中心负责需求立项上会、甄选属地合作伙伴，视频部负责评估上架需求、推进业支系统改造

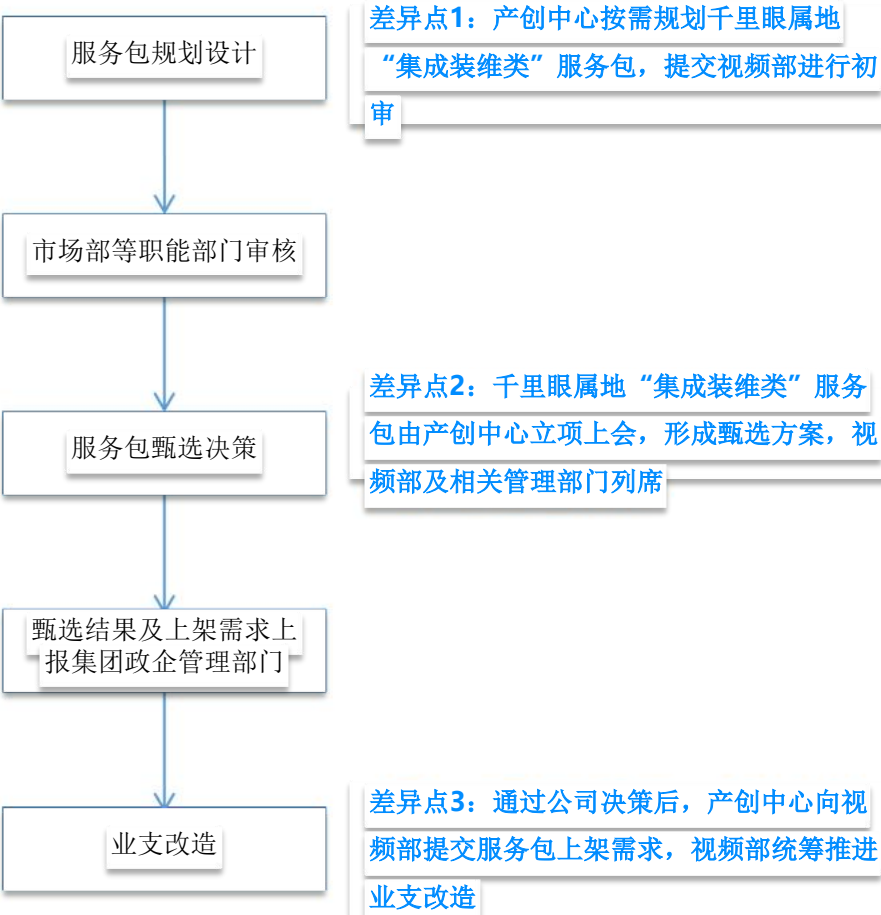

千里眼服务包总体规划原则：	
1、产创中心属地“集成装维类”服务包仅可支撑属地化简单集成及属地装维类业务	
2、 视频类核心产品 ，如监控摄像头、视频存储设备等，属于视频部业务范围，客户有相关需求时，应优先使用视频部负责的服务包进行支撑， 视频部邮件明确无法支撑的产品需求，使用属地“集成装维类”服务包进行交付	
部门	责任分工
视频部	1、评估 服务包规划是否符合千里眼产品线规划 2、评估服务包规划业务范围是否超出规划原则限制
产创中心	1、结合本部门业务发展及与千里眼产品业务关系，规划本部门需要上架的“集成装维类”服务包 2、与视频部沟通服务包业务规划合理性，视频部同意后方可进行后续工作推进

服务包业支上架管理说明：	
因集团IT需求管理变更，目前还未明确千里眼产品需求管理流程，各部门需提前计划报备上架需求，待流程确定后，视频部将进一步明确相关机制流程	
部门	责任分工
视频部	1、收集各部门潜在服务包上架需求； 向集团汇报千里眼服务包上架规划 ，沟通相关流程； 2、评估服务包上架时间，跟进服务包上架进度。
产创中心	1、提前规划服务包上架需求，上报视频部； 2、配合视频部向集团大视频部汇报服务包上架需求，准备上架相关材料；



三、千里眼属地“集成装维类”服务包业务交付责任分工



- 产创中心负责属地“集成装维类”服务包的**业务真实性**，完成售前沟通及项目交付；视频部**负管理职责**
- 视频部作为千里眼产品线管理部门，负责属地**DICT服务包交付确认审核**，计入**订单产品收入**



四、千里眼属地“集成装维类”服务包执行方案

背景说明：

- ①26年1月完成首批25个“产品定制类”服务包立项，已于3月下旬完成集客大厅上架，目前已开放订购
- ②26年3月31日，数智安防等2025年及之前上架的21个存量服务包已冻结，自3月31日起暂停订购
- ③以上46个服务包均已沟通省侧签署结算合同，目前已完成20省签约，其他省份已立项

存在问题：

- ①产创中心新规划属地“集成装维类”服务包，甄选合作伙伴并进行资费上架，因目前业支系统改造困难，新服务包上架预计耗时3-4个月
- ②属地新服务包上架，需产创中心沟通省公司签署结算补充协议，将新服务包资费纳入结算合同后方可发展业务，预计耗时3个月

建议：设置千里眼存量包划转方案

产创中心可根据属地供应商的情况选择方案一或者方案二开展存量服务包划转工作；划转后，主体责任同步划转给产创中心，视频部负管理责任

方案一

产创中心上会决策，划转存量服务包资费，甄选属地合作伙伴支撑业务

- 1、产创中心提交属地服务包规划，划转千里眼存量包；视频部审核；
- 2、产创中心上会决策甄选属地合作伙伴；视频部列席；
- 3、产创中心甄选属地合作伙伴，签约引入；
- 4、视频部负责配置集客大厅属地合作伙伴账号；

预计耗时：2个月

方案二

产创中心上会决策，划转存量服务包资费，划转存量服务包剩余合同额度

- 1、产创中心提交属地服务包规划，划转千里眼存量包；视频部审核；
- 2、产创中心上会决策划转存量服务包剩余合同额度（相关物料同步划转至产创中心）；视频部列席；

预计耗时：1个月

因集团暂停受理IT改造需求，存量包划转初期，新订单由视频部代产创中心接单，业务责任归属产创中心，视频部负管理责任

视频部负责完成存量服务包在途订单的闭环并负业务责任；在途订单：省侧前期已下单或能提供早于26年3月31日的省客合同或决策纪要，且由视频部接单的



五、下一步工作

产创中心：

- ① 26年6月中旬前按需完成属地服务包需求立项，6月底前完成上会决策
- ② 更新属地合作伙伴库，招募满足条件的合作伙伴
- ③ 组建属地服务包团队，对于订单审核、交付管理、供应链支付环节配置专业人员

视频部：

- ① 支撑产创中心属地服务包规划，做好存量服务包划转计划
- ② 完成在途项目闭环
- ③ 支撑产创中心相关业支系统账号配置，按需推动业支系统改造

市场运营部：

- ① 负责服务包规划整体规则
- ② 支撑内部合同划转和物料划转（负责沟通数智化部）



附件：千里眼服务包业务责任对照表



视频部服务包

服务包上架流程

属地服务包

视频部负责

设计服务包

产创中心负责，
视频部支撑

市场部等职能部门审核
服务包规划

视频部负责

公司领导决策会

产创中心负责，
视频部列席

甄选合作伙伴

视频部负责

上架需求及甄选结果报
集团政企审核

视频部负责

视频部负责

甄选结果及政企意见
报公司领导决策

产创中心负责，
视频部列席

视频部负责

签署结算合同

产创中心负责

视频部负责

业支改造，服务包
资费上架

视频部负责

服务包具备销售条件

视频部服务包

集客大厅订单受理流程

属地服务包

产创中心负责

网格售前：客户商机获
取

产创中心负责

产创中心负责、
视频部支撑

网格销售经理和产品售前
经理进行售前支撑

产创中心负责

产创中心负责

签署售前沟通确认书

产创中心负责

客户经理订购标品资费和
服务包资费（集客大厅）

合作伙伴、地市业管、省
侧业管审批


视频部负责

物联网公司审批

产创中心负责
（由于业支系统改造流程停
滞，存量包划转初期，新订
单由视频部代产创中心接单）

订单生效

附件：千里眼服务包业务责任对照表

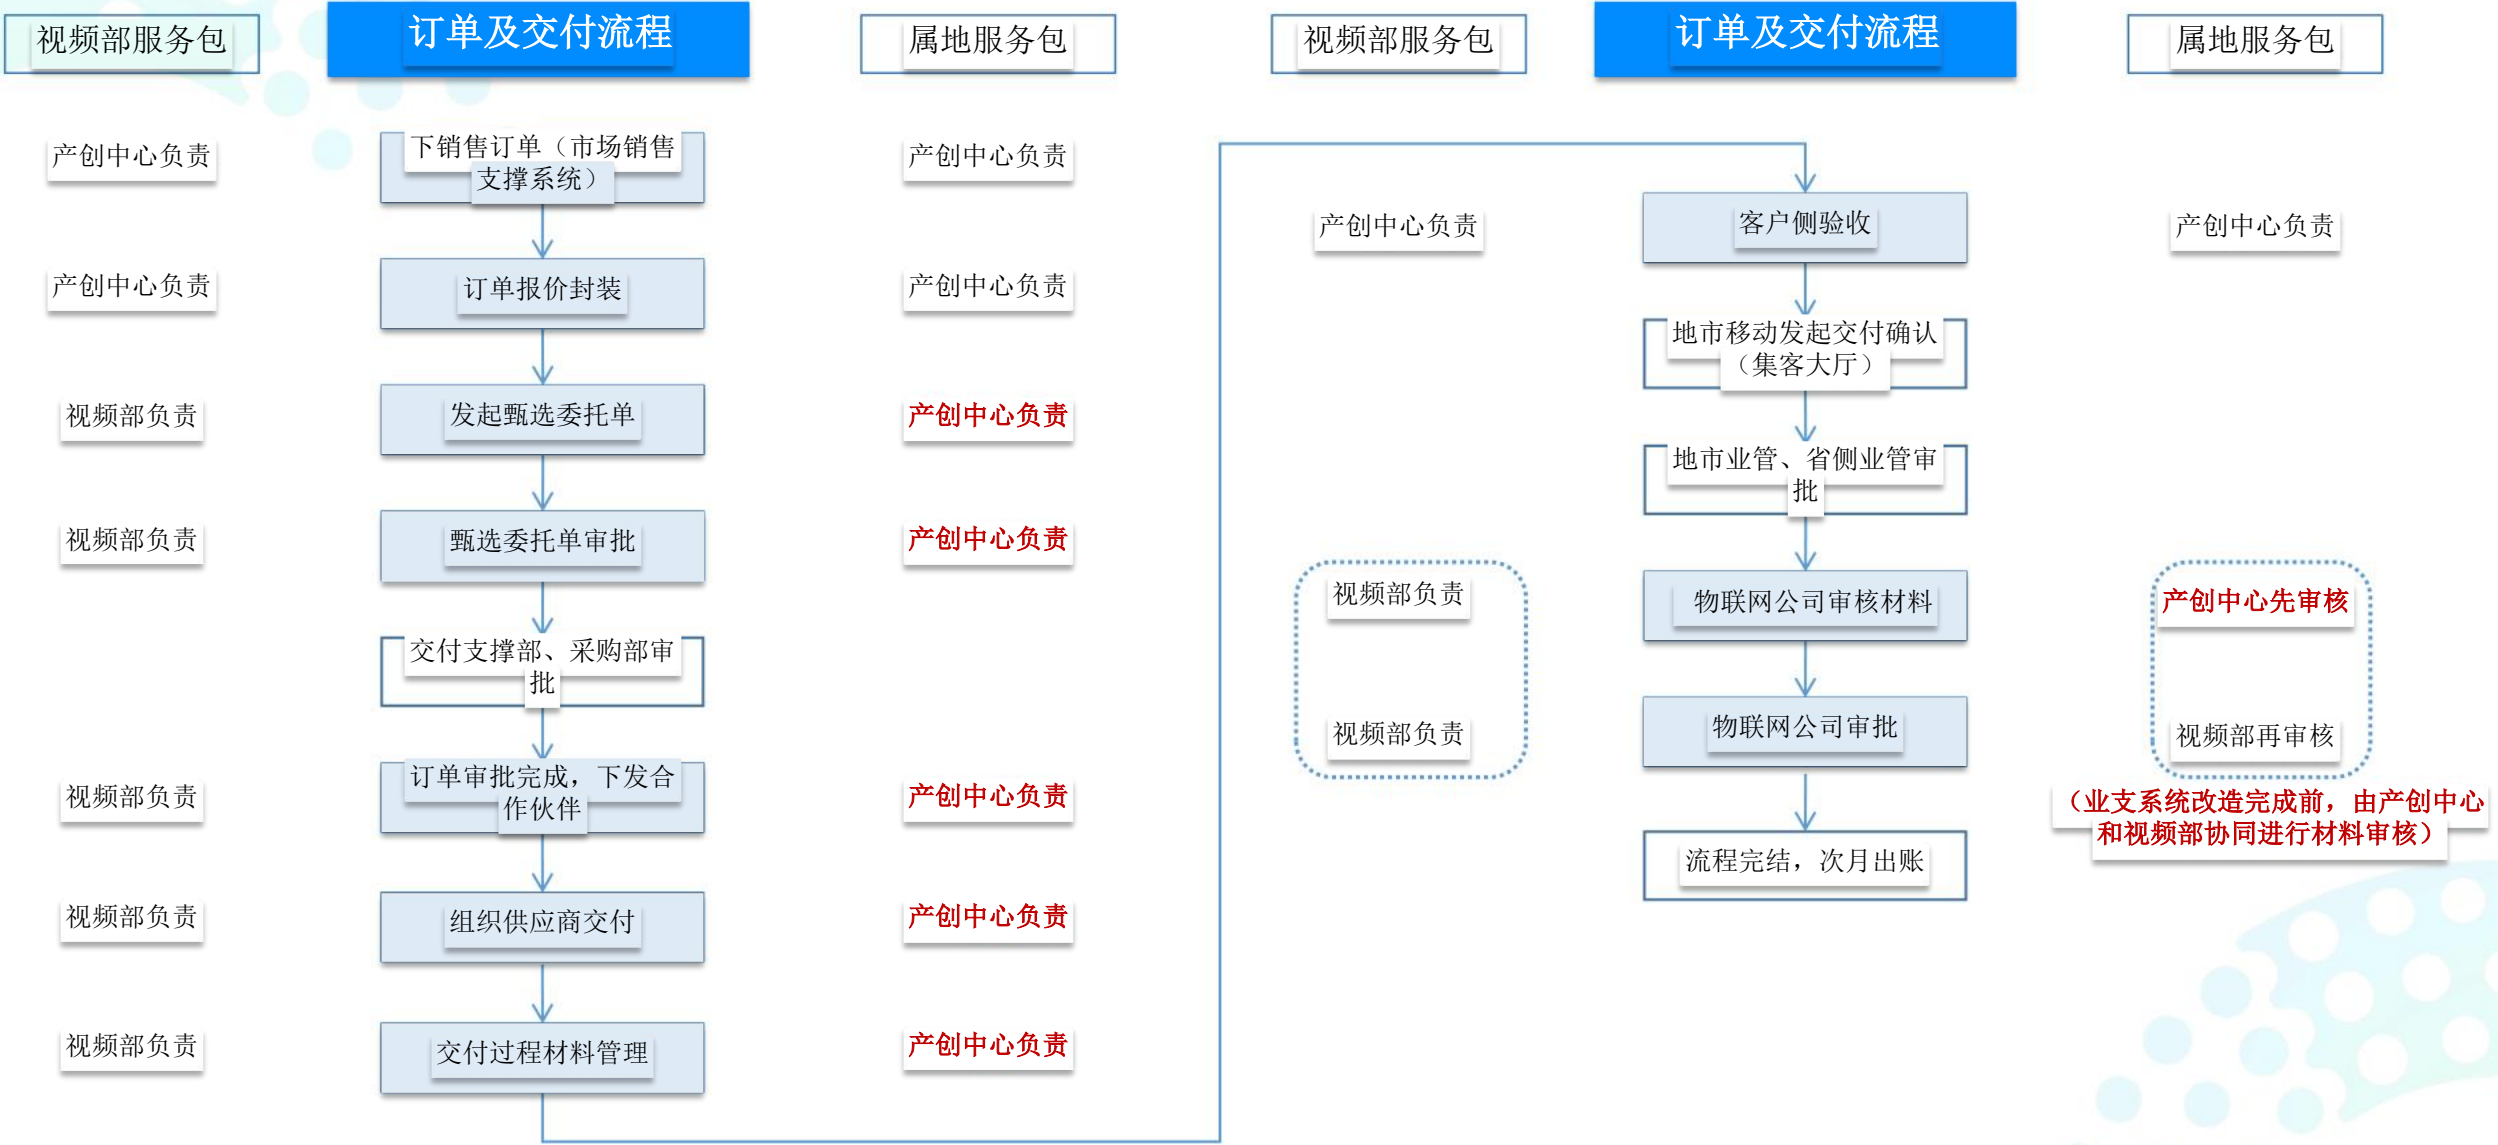



附件：千里眼服务包业务责任对照表



视频部服务包

产创中心负责

产创中心负责

视频部负责

计收流程

发起订单计收

订单所属部门审批（核算系统）

产品合规专员审批

交付支撑部审批

财务部审批

计收完成

属地服务包

产创中心负责

产创中心负责

产创中心负责

视频部服务包

产创中心负责

产创中心负责

产创中心负责

视频部负责

结算流程

开票、准备报账材料

递交报账材料，发起报账

客户财务部门打款

业务部门核销应收单

根据回款情况向供应商报账

财务部付款给供应商

流程结束

属地服务包

产创中心负责

产创中心负责

产创中心负责

产创中心负责
